





## VERKFUNDARGERÐ

Verkheiti		Verkkaupi		Verknúmer
Árnes og Brautarholt gatnagerð 2017		Skeiða og Gnúpverjahreppur		2272-013
Fundarefni		Fundarstaður		Nr. fundar
<b>13. Verkfundur</b>		Árnes		13
Fundarboðari	Fundarritari	Fundardags.	Fundartími	Dags. Fundarg.
Bárður Árnason	Bárður Árnason	02.10.2018	10:00 – 11:00	02.10.2018
Fundarmenn		Fyrirtæki		
Vignir Svavarsson 892 4485 ( <a href="mailto:nesity@simnet.is">nesity@simnet.is</a> )		Nesity ehf		
Kristófer Tómasson 861 7150 ( <a href="mailto:kristofer@skeidgnup.is">kristofer@skeidgnup.is</a> )		Skeiða- og Gnúpverjahreppur		
Skafti Bjarnason ( <a href="mailto:skafti@skeidgnup.is">skafti@skeidgnup.is</a> )		Skeiða- og Gnúpverjahreppur		
Davíð Sigurðsson 892 2239 ( <a href="mailto:david@utu.is">david@utu.is</a> )		Tæknisvið uppsveita		
Bárður Árnason 665 6908 ( <a href="mailto:bardur.arnason@efla.is">bardur.arnason@efla.is</a> )		Efla		
Einar Guðnason ( <a href="mailto:ainar.heidarbrun@gmail.com">ainar.heidarbrun@gmail.com</a> )		Hitaveita		
Ari Einarsson		Vatnsveita		
Sigurður Pétursson		RARIK		
Erlingur Bjarnason		RARIK		
Sigvaldi Jónsson		Ljósleiðari		
Fjarverandi		Fyrirtæki		
Dreifing		Fyrirtæki		
Fundamenn				
Dagskrá Fundar		Dagsetning næsta fundar	Tími næsta fundar	
1 Síðasta verkfundagerð		óakveðið	10:00	
2 Framvinda verks				
3 Mannafli og tæki				
4 Hönnunargögn og breytingar				
5 Byggingarefni				
6 Kröfur og athugasemdir verktaka				
7 Kröfur og athugasemdir verkkaupa				
8 Uppgjör				
9 Önnur mál				
10 næsti verkfundur				
Staða fundargerðar				
<input type="checkbox"/> Í vinnslu <input type="checkbox"/> Drög til yfirlestrar <input checked="" type="checkbox"/> Lokið				




Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
1.	Síðasta verkfundagerð. Síðasta fundagerð var samþykkt og undirrituð.	

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
2.	<p><b>Framvinda verks.</b> <b>Brautarholt</b> <i>Næst er að færa ljósastaura. Er að klárast.</i> Rarik þarf að fara yfir rafmagnsmál og Míla yfir fjarskiptamál. Rarik er byrjað að færa staura. Reikna með að leggja nýja strengi í Holtagötu 1. Er að klárast.</p> <p><b>Árnes</b> Götur verða malbikaðar á morgun.</p> <p>Framvinda fram að næsta fundi Brautarholt: Hitaveitulagnir að raðhúsum verða lagðar og götur gerðar klárar undir malbik. Árnes: Eftir malbikun verður ekki meira gert í Hamra og Heiðargerði fyrr en næsta vor.</p>	
3.	<p><b>Mannafli og tæki.</b> Á staðnum eru 3 menn. Vörubílar og 2 gröfur og tæki eftir þörfum.</p>	
4.	<p><b>Hönnunargögn og breytingar í Brautarholti</b> <i>Fráveita:</i> <i>Leggja þarf fráveituna útfyrir lóðamörk raðhúsaloðar. Ólokið</i> Göngustígur er nú hafður yfir lögnum og búið er að leggja fráveitun.</p> <p>Vatnsveita: Búið að leggja í göngustíginn og vatnsveitu lokið.</p> <p>Ljósastaurar: <i>Færa þarf ljósastaura í báðum götunum. Ákveðið að staurar í fyrstu götu verða norðan við götu í lóðamörkum og allir staurar verði vestan við götu í lóðamörkum við holtagötu 2 (brekkuna). Er að klárast.</i> Bæta þarf við 1 ljósastaurum við göngustíg, skilin verður eftir hönk en staur ekki settur upp. <i>BÁ sendir Davíð kantlínugrunn og hann setur inn í sinn götugrunn og sendir á Sigurð. Lokið Einnig þarf að leggja heimtaugar inn að raðhúsaloðum og athafnalóðum. Sig. Pet. Sér um þetta. Er í vinnslu</i></p> <p>Ljósleiðari: <i>Færa þarf ljósleiðara inn í gangstétt. Lokið</i> Einnig þarf að leggja heimtaugar inn að raðhúsaloðum og athafnalóðum. Sigvaldi sér um þetta. <b>Ólokið</b></p> <p>Hitaveita: Búið að panta efni í hitaveitu að raðhúsum. Eftir að leggja.</p>	<p>BA S.P.</p>

Nr.	Dagskrárliðir	Ábyrgð / dags.
	<p>Míla: <i>Leggja þarf heimtaugar inn að raðhúsalóðum og athafnalóðum. Þarf að gerast samhliða vinnu RARIK. Lokið.</i></p> <p>Gatagerð: <i>Ákveðið að bæta inn í verkið bílastæðum beggja vegna við fyrstu götuna líkt og gert er ráð fyrir í skipulaginu. óbreytt</i></p> <p><b>Hönnunargögn og breytingar í Árnosi</b> <u>Hamragerði:</u></p> <p><u>Heiðargerði:</u></p> <p><u>Bugðugerði:</u> <i>Davíð skoðar lengingu götu og færslu fráveitu einnig frá skóla. Bárður lætur Pál gera grunn með lóðum og fráveitulögnum í vinnslu. (kominn er grunnhugmynd um fráveitutilhögun, verður unnið í haust og malbiki frestað fram á næsta ár).</i> Bugðugerði 3. Kominn er fráveita, vantar aðrar veitur. Vatn var lagt með RARIK, Míla ekki búinn og hitaveita í vinnslu.</p> <p><u>Skólabraut:</u> <i>Davíð skoðar breikkun Skólabrautar.</i> <i>Lagnir verða lagðar frá Skóla og fyrir 3 lóðir við Skólabraut. Þessi mál verða skoðuð í haust</i></p>	
5.	<b>Byggingarefni.</b>	
6.	<b>Kröfur og athugasemdir verktaka</b> <i>Ekkert bókað</i>	
7.	<b>Kröfur og athugasemdir verkkaupa.</b> Vonast eftir því að lagt verði á götu í Brautarholti fyrir 1 nóv. 2018	
8.	<b>Uppgjör.</b> Lagðir verða fram reikningar fyrir Brautarholt annars vegar og Árnosi hins vegar.	
9.	<b>Önnur mál</b> <i>Kortagrunnar verða svo leiðréttir eftir að vinnu líkur. Gera þarf ný lóðablöð. Búið er að gera drög af lóðarblöðum. Davíð ætlar að fara yfir núverandi lagnir og lagnakvaðir <b>Lokið</b>. Einnig yfir hvar innkeyrslur eiga að vera, nýtingarhlutfall og fleira. óbreytt</i>	  

Nr.	Dagskrárlíðir	Ábyrgð / dags.
	<p><b>Aukaverk:</b> <i>Krístófer vill láta laga og malbika innkeyrslu á plan milli verslunar og félagsheimilis. Nota skal sömu einingaverð. Þessu verki þarf að skila á sér reikningi, þetta verður malbikað á morgun.</i></p> <p><i>Einnig skal jarðvegsskipta og malbika við Heiðargerði nr 7 og keyra í innkeyrslu við Heiðargerði 3. Davíð og Vignir ræða við íbúa í nr. 3 um útfærslu við innkeyrslu Malbikun á þessu verður seinna.</i></p> <p>Verkátun: Malbikun gatna verði lokið fyrir 1 nóv. 2018 Kantsteinar og malbikun gangstétta verður lokið fyrir 15 júní 2019.</p>	
10.	<p><b>Næsti verkfundur.</b> Næsti reglulegi verkfundur: 16 október kl 10:00</p>	

Fundarskjöl:

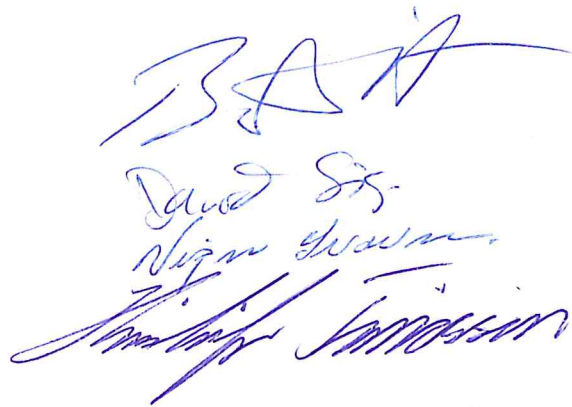

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top and two smaller ones below it.
